TECHLAN
Infrastructures Réseaux

Rapport de synthèse sur les traces

Client	: ALSTOM
Emplacement	: ALSTOM
Opérateur	: TECHLAN
Notes	: EIE

Nom de fichier	: A01.SOR
Date/Heure	: 9-Déc-2020 09:31
Indicateur de données	: BC(création)
ID de câble	:
ID de fibre	: 1
Code de câble	:
Position de début	: BATIMENT 395
Position de fin	: BATIMENT 444
Opérateur	: TECHLAN
Commentaire	: EIE
Instrument	: MT9085B-063 (6261903957)
Étalonnage	:

Paramètres de test

Longueur d'onde	: 1310 nm SM
Calibre	: 2.5 km
Impulsion	: 10 ns [PS]
Moyenne	: 10 s (20480)
Résolution	: 0.5 m

Résumé des résultats de test

	1310 nm	Réussite/Échec
Longueur de fibre	2.2607 km	
Atténuation totale	1.534 dB	RÉUSSITE
Total Evénement	3	
ORL	33.367 dB	

Événements graphiques

Total Evénement: 3

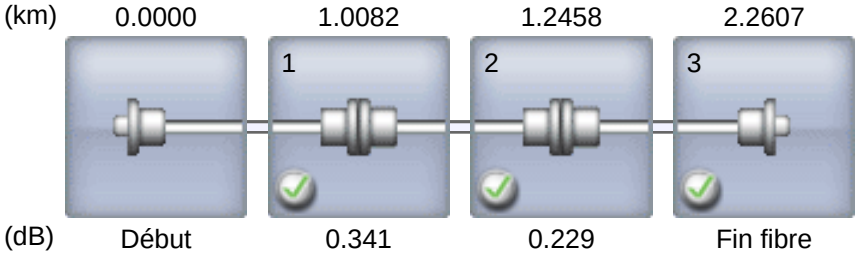



Tableau des événements

Nº	Dist. (km)	Type	Perte (dB)	Réflex (dB)	Portée (km)	Att. totale (dB)
1	1.0082		0.341	-52.134	1.0082	0.551
2	1.2458		0.229	-49.799	0.2376	0.769
3	2.2607		Fin fibre	-16.776S	1.0149	1.534

Seuils Réussi/Echoué

Evénement non réflectif (fusion)	: 0.20 dB
Evénement réflectif (connecteur, mécanique)	: 0.70 dB
Réflexion	: -33.0 dB
Atténuation de fibre(dB/km)	: 1.00 dB/km
Atténuation totale	: 3.0 dB
Perte de diviseur	: 3.0 dB
ORL	: 27.0 dB

Trace OTDR

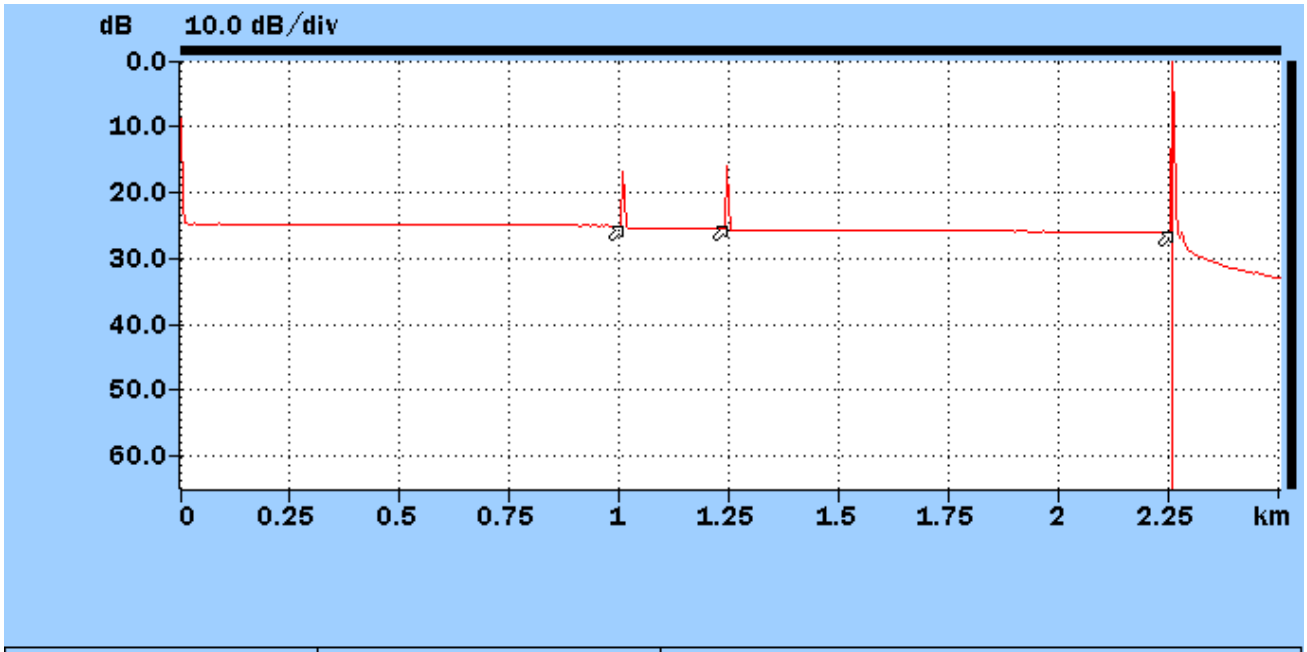

A : 2.2607 km	Att. 2-Pt	LO : 1310 nm SM	IR : 1.467700
B : 2.2607 km	0.000	C : 2.5 km	RES : 0.5 m
A->B : 0.0000 km	Réflex -16.778S	PW : 10 ns [PS]	BAL : 10 s (20480)
