TECHLAN
Infrastructures Réseaux

Rapport de synthèse sur les traces

Client	: RUBIS TERMINAL -SES D1
Emplacement	: RUBIS TERMINAL -SES D1
Opérateur	: TECHLAN
Notes	: SES D1

Nom de fichier	: SE-02.SOR
Date/Heure	: 4-Mai-2022 09:53
Indicateur de données	: BC(création)
ID de câble	:
ID de fibre	: 2
Code de câble	:
Position de début	: LOCAL INFORMATIQUE
Position de fin	: LOCAL AUTOMATIQUE
Opérateur	: TECHLAN
Commentaire	: SES D1
Instrument	: MT9085B-063 (6261903957)
Étalonnage	:

Paramètres de test

Longueur d'onde	: 1300 nm MM
Calibre	: 0.5 km
Impulsion	: 3 ns
Moyenne	: 15 s (12288)
Résolution	: 0.1 m

Résumé des résultats de test

	1300 nm	Réussite/Échec
Longueur de fibre	0.0064 km	
Atténuation totale	**.***	ÉCHEC
Total Evénement	1	
ORL	23.251 dB	

Événements graphiques

Total Evénement: 1

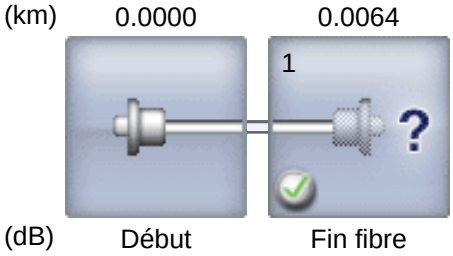



Tableau des événements

Nº	Dist. (km)	Type	Perte (dB)	Réflex (dB)	Portée (km)	Att. totale (dB)
1	0.0064		Fin fibre	**.***	0.0064	**.***

Seuils Réussi/Echoué

Evénement non réflectif (fusion)	: 0.20 dB
Evénement réflectif (connecteur, mécanique)	: 0.70 dB
Réflexion	: -33.0 dB
Atténuation de fibre(dB/km)	: 1.00 dB/km
Atténuation totale	: 4.0 dB
Perte de diviseur	: 3.0 dB
ORL	: 27.0 dB

Trace OTDR

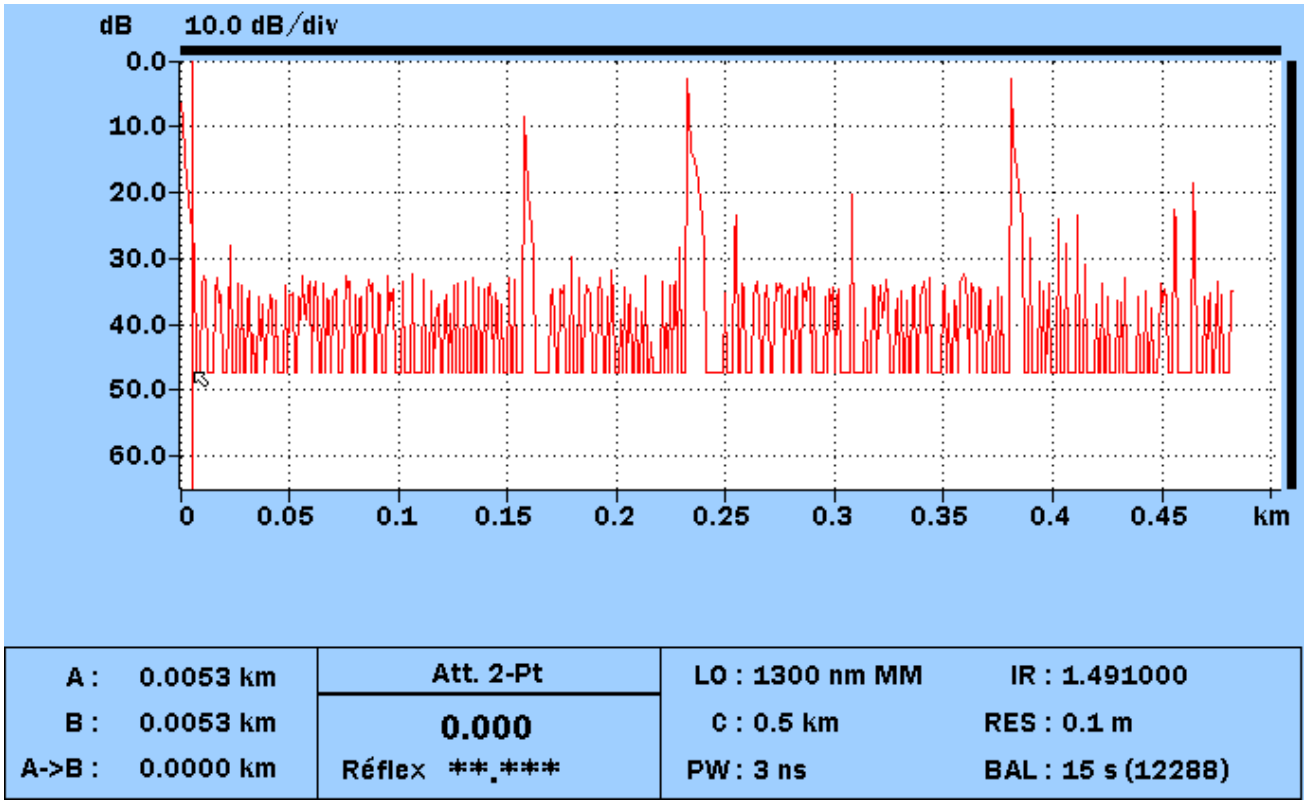

A : 0.0053 km	Att. 2-Pt	LO : 1300 nm MM	IR : 1.491000
B : 0.0053 km	0.000	C : 0.5 km	RES : 0.1 m
A->B : 0.0000 km	Réflex **.***	PW : 3 ns	BAL : 15 s (12288)
